

BV: 2026-03 - verfahrensfreie Pultdachhalle, Am Wirthsfeld 13, 88319 Aitrach

Tel: 07565 / 9434180, Schnee (100 kg) 80 kg + 15 kg PV

Hallenmaße (Länge x Breite x Höhe) 12,5 x 8 x 4 m

Bausatz: landwirtschaftliche Maschinenhalle - verfahrensfrei

	Einheit	Menge	
1 Eingabeplanung - ohne - da verfahrensfrei			bauseits
2 Gesamtkonstruktion			11.099,88 €
2.1 Konstruktionszeichnungen - vf	psch	1	enthalten
Erstellen von Konstruktionszeichnungen für eine Halle in 1-facher Ausfertigung nach statischer Vorbemessung			
Dacheindeckung			
2.2 Stahltrapezprofil liefern	m ²	134,24	enthalten
Lieferrn eines Stahltrapezprofils (nach DIN 18807) und der Ortgangprofile usw. (verzinkt) nach Statik, mit oberseitiger Beschichtung (25 ym; ziegelrot) und Rückseitenschutzlack, (Mehrpreis 50 ym/25 ym Spezial-Agrarbeschichtung; der IFBS empfiehlt bei PV-Dächern eine Beschichtung von 45ym zu verwenden) inkl. Montagezubehör (Verbindungsmitel) in Edelstahl. Verpackungsfolie und Paletten verbleiben auf der Baustelle.			
Holzkonstruktion			
2.3 Schnittholz - Bausatz mit Standardabbund	psch	1	enthalten
Lieferrn des sägerauhen Schnittholz-Bausatzes; Stützen und Pfetten Güteklasse A (NH C 24) nach EC 5 - inkl. aller erforderlichen Verbindungsmitel (verzinkt) nach Statik (Aufpreis für Trocknung auf ca. 20 % Holzfeuchte: 55 €/m ³ zuzüglich Holz-Übermaßkosten)			

3 Wandverkleidung + Tore

bauseits/alternativ

Wandverkleidung Trapez liefern

3.1 inkl. Schnittholz-Wandriegel liefern

psch 1

3.285,00 €

Liefern der senkrechten Wandverkleidung mit 4 Außeneckwinkeln, mit Wandriegeln aus sägerauhem Schnittholz inkl. Befestigungsmitteln nach Statik; (weitere Kantteile alternativ gegen Aufpreis)

bauseits/alternativ

Schiebetore mit Trapezverkleidung

3.2 Industrie C-Schienensystem

Stück 2

3.373,24 €

Liefern, der gesamten Torkonstruktion (BSH 6x12 in Industriequalität) inkl. aller Befestigungsmittel, C-Laufschienenprofil mit Industrie-Rollapparaten, Halter galvanisch verzinkt, Wandtrapezprofil, Luft zwischen Pfette/Tor bzw. Stütze/Wand/Tor und Tor/Tor ist möglich - OHNE Absperrvorbereitung (Streifenbürsten zum seitlichen "abdichten" auf Nachfrage gegen Aufpreis erhältlich), evtl. Betonsockel für Torführung (PVC-Schiffchen) unten wird bauseits betoniert ; Abstand zur Bodenplatte / Fundament 4 cm → 2 cm; Torgröße nach Skizze

4 Fundamente/Betonarbeiten

bauseits/alternativ

4.1 IPE liefern

Stück 6

1.831,22 €

Liefern der IPE-Stahlprofile in **verzinkter** Ausführung mit Bohrungen und Längen nach Statik mit Sockellängen nach Zeichnung.

Alternativ: Herstellen des Stützen-Druckkontaktes über ein angeschweiste Stahlplatte: 45 € pro IPE-Profil

bauseits/alternativ

4.2 Baustahl für Punktfundamente nach Statik

Stück 6

411,50 €

Liefern der Fundamentbewehrung

5 Dachrinne

bauseits/alternativ

5.1	Regen-Kastenrinne liefern	m	13,44	707,24 €
	Liefern einer Kastenrinne aus konisch gekanteten Blechen in Uginox Edelstahl; Stöße vernietet und mit Silikon abgedichtet inkl. aller Befestigungsmittel (Edelstahl), Ablaufstutzen, Abläufe können das Durchfahrtsmaß verringern.			
	Gesamtsumme netto - Pauschalpreis			11.099,88 €
	aktuelle gesetzliche MwSt.		19,0%	2.108,98 €
	Gesamtsumme brutto			13.208,86 €

Grundsätzlich muss vor Baubeginn die Bauart und Geometrie wegen örtlichen Bauvorschriften bzw. anderer öffentlicher Belange verbindlich mit dem Bauamt abgeklärt werden!

Bauseitige Leistungen (= bauseits - vom Bauherrn auszuführen / nicht in unserem Leistungsumfang enthalten):

- o sämtliche Montagearbeiten

Bayern - nach Artikel 57 BayBO Abs. 1, Satz c: freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig und nicht unterkellert sind, höchstens 100 m² Grundfläche und höchstens 140 m² überdachte Fläche haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind.

Bayern - nach Artikel 57 BayBO Abs. 1, Satz c: freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig und nicht unterkellert sind, höchstens 100 m² Grundfläche und höchstens 140 m² überdachte Fläche haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind.

Zahlungsmodalitäten | Abschlagszahlungen:

Zahlungen nach Vereinbarung; Preisanpassungsvorbehalt


- o 50 % mit Auftragserteilung
- o 50 % vor Materialbestellung / Teillieferung

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung, mit nachfolgender Unterschrift und Rückmail.

Datum, Ort

Unterschrift

Schnitt A-A

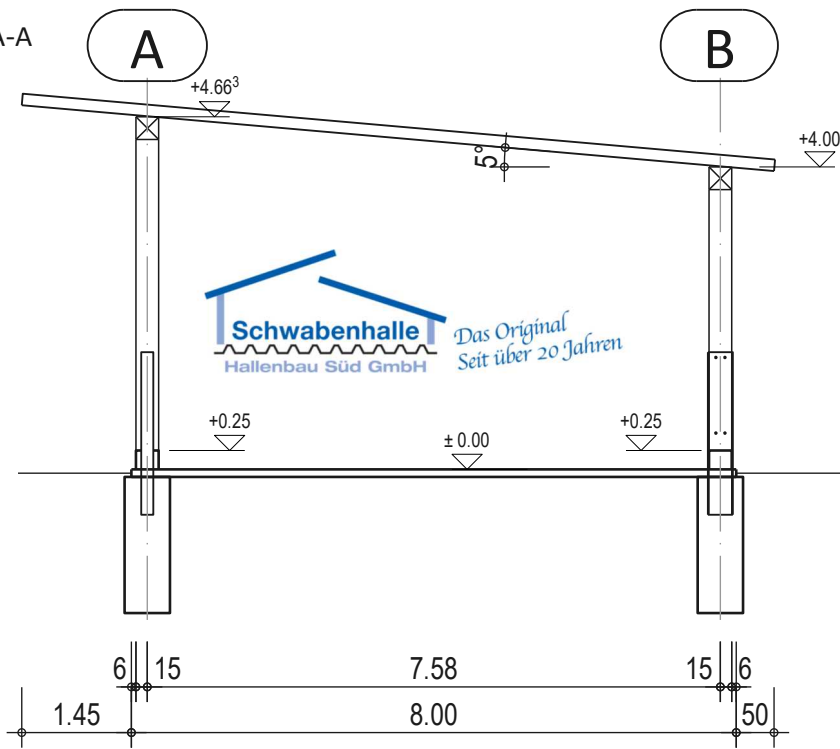

Schwabenhalle

Hallenbau Süd GmbH

Am Wirthsfield 13 · 88319 Aitrach

Tel. 07565/943418-0 · Fax 943418-9

www.schwabenhalle.de

verfahrensfreie Halle - PD

100 kg Schnee

02.02.2023

gez.: Gei

Maßstab: 1:100

Grundriss

